



RENVION

RENVION PROJE VE MARKA GELİŞTİRME

++++

Fikirden ürüne, üründen pazara uzanan
proje yolculuğu.

Sunan:

mert çakin

01.10.2026 –
23.07.2027



Sunumun Amacı

++++

Bu sunum; RENVION'un marka oluşturma, ürün geliştirme, planlama, prototip üretimi, test, dijitalleşme ve ticarileşme süreçlerini tek bir akışta, bütüncül biçimde ortaya koymaktadır.

01 Süreç Bütünlüğü

Fikirden ürüne uzanan tüm aşamalar tek bir sunum akışında yapılandırılmıştır.

02 Çok Boyutlu Kapsam

Marka kimliği, teknik geliştirme, prototip, test ve dijital altyapı birlikte ele alınmaktadır.

03 Ticarileşme Odağı

Seri üretime hazırlık ve pazar girişi sürecinin net bir görünümü sunulmaktadır.





RENVION Proje Sunumu

İçindekiler

• →	Fikir ve Araştırma	04
• →	Marka ve Ürün Geliştirme	09
• →	Planlama ve Proje Yönetimi	13
• →	Prototip ve Test Süreçleri	23
• →	Dijitalleşme ve Altyapı	28
• →	Pazarlama ve İçerik Stratejisi	32
• →	Ticarileşme ve Büyüme	34
• →	Sonuç ve Gelecek Vizyonu	35

Problem Tanımı

++++

Problem


Geleneksel yenilenebilir enerji sistemleri büyük ölçüde çatı ve geniş yüzeylere bağımlıdır. Bu durum kentsel yapılaşmada alan kısıtlaması, estetik uyumsuzluk ve yüksek kurulum maliyeti sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Fırsat

Binalarda kullanılan pencere ve cam yüzeyleri, büyük ve kullanılmayan bir enerji üretim potansiyeli taşımaktadır. Bu yüzeylerin şeffaf fotovoltaik teknoloji ile entegrasyonu, hem enerji üretimini hem de yapı estetiğini bir arada sunabilir.

Temel Bağlam

Enerji verimliliği, kentsel dönüşüm ve yapı teknolojilerinin kesişim noktası.

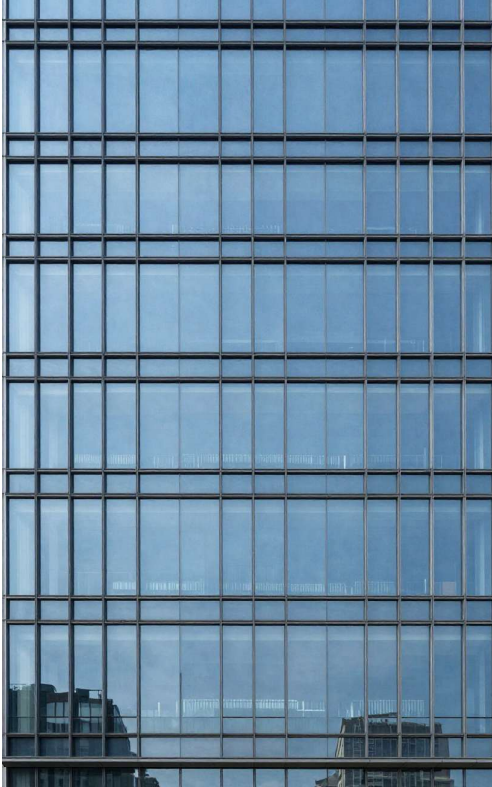



Çözüm Fikri ve Hedef Kitle

Pencere ve cam yüzeylere entegre şeffaf güneş enerjisi modülleri, mevcut yapı stoğunu enerji üreticisine dönüştürür. RENVION çözümü; bireysel kullanıcıdan kurumsal yapılara, mimari projelerden sektörel uygulamalara kadar geniş bir hedef kitleye hitap eder.

++++

Temel değer önerisi: Çatı alanına ihtiyaç duymadan, mevcut pencere yüzeylerinden temiz enerji üretimi. Estetik, modüler ve ölçeklenebilir bir yapı teknolojisi çözümü.

01

Bireysel

Ev ve daire sahipleri; enerji tasarrufu ve bağımsızlık arayan bireysel kullanıcılar.

02

Kurumsal

Ofis binaları, AVM ve kurumsal yapılar; sürdürülebilirlik hedefi olan işletmeler.

03

Sektörel

Mimarlar, müteahhitler ve yeşil bina sertifikasyonu hedefleyen yapı sektörü paydaşları.



Paydařlar ve Marka Stratejisi

++++

Paydařlar


To be a pioneer in engineering that not only solves current problems but also prepares solutions for future challenges. We believe that engineering innovation should be oriented towards long-term impact.


Marka Stratejisi

RENVION ekosistemi; bireysel ve kurumsal müşteriler, cam/pencere tedarikçileri, yapı malzemeleri üreticileri, mühendisler, üretim ortakları, mimarlar ve yatırımcılardan oluşmaktadır.

Değer Önerisi

Şeffaf, entegre, sürdürülebilir – yapıya değer katan enerji çözümü.

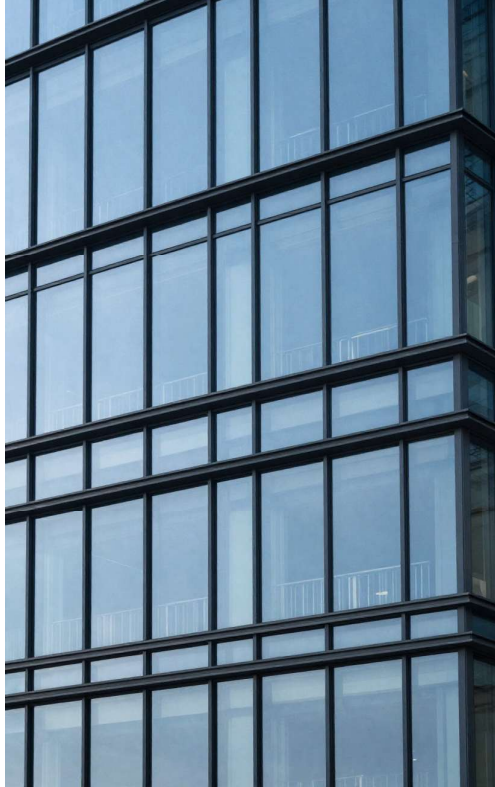

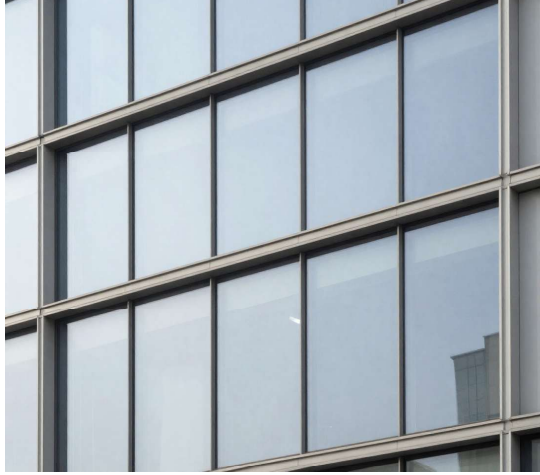

Marka Kimliği

RENVION markası; isim, görsel dil ve iletişim tonu bakımından enerji, teknoloji ve sürdürülebilirliği bir arada temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Marka sistemi tutarlı, modern ve güçlü bir kimlik sunar.

++++

Marka renkleri #0B3D91 (güven ve mühendislik) ile #4CAF50 (sürdürülebilirlik ve enerji) üzerine kuruludur. Nötr açık gri/beyaz tonlar sadelik ve okunabilirlik sağlar.

01

İsim & Logo

RENVION: Yenilenebilir enerji ve inovasyon kavramlarından türetilmiş, pencere/ev geometrisiyle desteklenen özgün marka kimliği.

02


Renk Paleti

#0B3D91 Mavi, #4CAF50 Yeşil, açık gri ve beyaz nötr tonlar.

03

Tipografi & Ton

Manrope ExtraBold başlıklar, Manrope Regular gövde; net, profesyonel ve ilham verici iletişim dili.



Ürün Konsepti

++++

RENVION, pencere ve cam yüzeylere entegre edilebilen modüler şeffaf güneş enerjisi çözümüdür. Mevcut yapı stoğuna uyumlu, estetikten ödün vermeden enerji üreten yenilikçi bir ürün mimarisi sunar.

01 Modüler Ürün Yapısı

Farklı pencere boyutlarına uyarlanabilen standart modül birimleri; kolay montaj ve ölçeklenebilir kurulum imkânı.

02 Pencereye Entegrasyon

Şeffaf fotovoltaik katman; doğal ışık geçirgenliğini korurken güneş enerjisini elektriğe dönüştürür.

03 Kullanım Senaryoları


Konut, ofis ve ticari yapılarda bağımsız veya şebeke bağlantılı enerji üretimi.



Ürün Geliştirme Yaklaşımı

RENVION ürün geliştirme süreci, pencereye entegre şeffaf güneş enerjisi çözümünün konsept aşamasından teknik tasarıma ve prototipe kadar sistematik bir ilerlemeyi kapsamaktadır.

Her aşama, bir sonrakinin temelini oluşturacak şekilde yapılandırılmış olup mühendislik gereksinimleri, malzeme seçimi ve üretilebilirlik kriterleri gözetilerek yürütülmektedir.

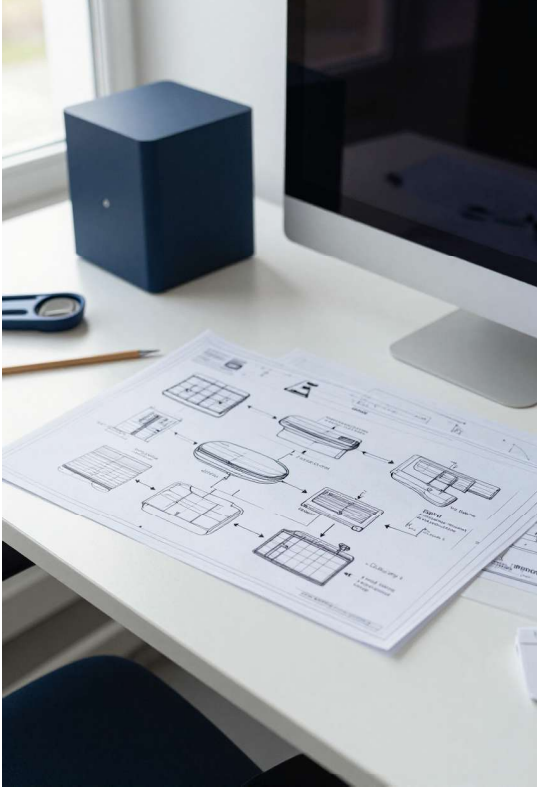

++++

01

Konsept Tasarım

Ürün fikrinin teknik ve işlevsel gereksinimlere dönüştürülmesi.

02

Teknik Tasarım

Mühendislik çizimleri, malzeme seçimi ve üretilebilirlik analizi.

03

Prototip Hazırlığı

İlk prototip üretimi ve doğrulama testlerine hazırlık.

Proje Ekibi ve Roller

++++



Teknik Ekip

Ürün Geliştirme Lideri: Ürün konsepti, teknik tasarım ve prototip süreçlerinin yönetimi.
Mühendislik Sorumlusu: Yapısal analiz, malzeme seçimi ve üretim teknik desteği.
Dijital Altyapı Uzmanı: Web, yazılım ve AI araç entegrasyonlarının geliştirilmesi.

Strateji Ekibi

Marka ve İletişim Sorumlusu: Marka kimliği, içerik stratejisi ve dijital varlık yönetimi.
Pazarlama ve Ticarileşme: Hedef kitle analizi, satış kanalları ve büyüme planlaması.
Proje Yöneticisi: Takvim, kaynak, bütçe ve paydaş koordinasyonunun yönetimi.

Ortak

Sorumluluklar

Risk yönetimi, test değerlendirme, paydaş iletişimi ve süreç iyileştirme.






Proje Yönetim Yaklaşımı

++++

Proje sürecinde görev bağımlılıkları, kaynak planlaması ve koordinasyon mekanizmaları birlikte yönetilmektedir. Bu yaklaşım, her ekip üyesinin aynı anda yalnızca bir kritik göreve odaklanmasını ve sürecin kesintisiz ilerlemesini sağlar. Planlama, haftalık iş günü bazında yürütülmekte; görevler arası bağımlılıklar ve iş yükü dengeleme sürekli izlenmektedir.



01

Görev Bağımlılıkları

Birbirini takip eden görevlerin sırası ve öncelik ilişkileri.

02

Kaynak ve İş Günü Planlaması

Aynı kişinin eş zamanlı iki göreve atanmaması; iş günü bazlı yük dengesi.

03

Koordinasyon ve Takip

Haftalık ilerleme takibi, gecikme tespiti ve anlık aksiyon güncelleme.

9 Ana Proje Etabı

++++

Projenin dokuz ana çalışma başlığı; araştırmadan ticarileşmeye uzanan yapılandırılmış süreç. Her etap bağımsız yönetilebilir iş paketlerine ayrılmıştır.

04 Planlama – Gantt, kaynak ve tedarik planlaması.
05 Test – Elektrik, dayanıklılık ve pilot uygulama testleri.
06 Dijitalleşme – Web, AI araçları ve dijital altyapı.
07 Pazarlama – İçerik ve kampanya stratejisi.
08 Ticarileşme – Seri üretime hazırlık ve satış kanalları.

01

Araştırma & Fikir

Problem tespiti, fırsat analizi ve çözüm fikrinin oluşturulması.

02


Marka & Kimlik


RENVION marka stratejisi, logo, renk ve iletişim tonu.

03

Ürün & Prototip


Konsept tasarımı, teknik geliştirme ve 20 prototip üretimi.

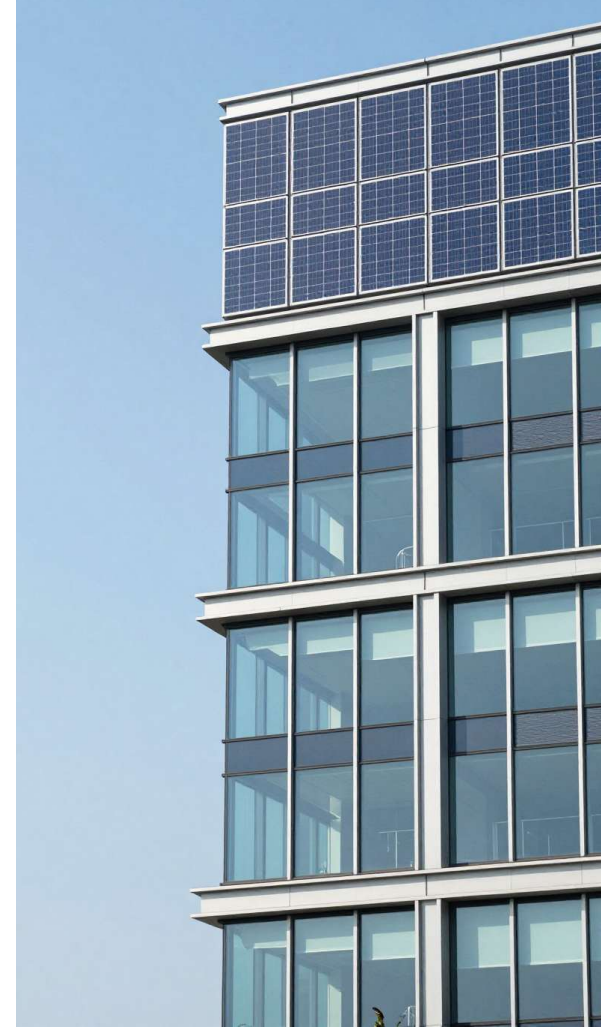

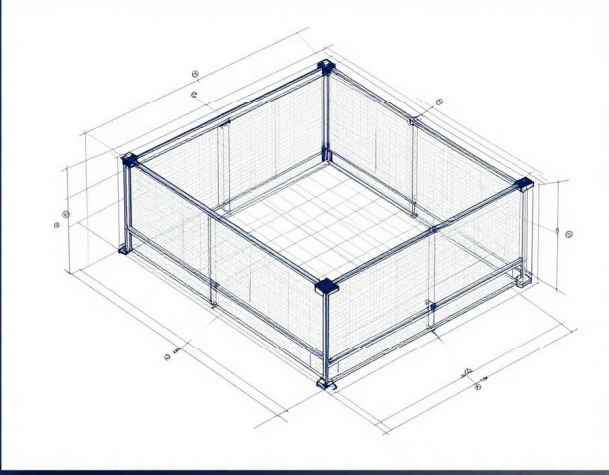


RENVION Proje

İş Kırılım Yapısı




Marka & Kimlik Geliştirme

E1




Ürün Konsepti & Teknik Tasarım

E2




Proje Planlama & Kaynak Yönetimi

E3




Tedarik & Satın Alma Süreci

E4




Prototip Üretimi (20 Adet)

E5




Test & Pilot Uygulama (10 Saha)

E6



Dijital Altyapı & SmartLead AI

E7



Pazarlama & Ticarileşme Hazırlığı

E8

Proje Takvimi

Proje dönemi 01.10.2026 – 23.07.2027 tarihleri arasında toplam 9 ana etap üzerinden yürütülmektedir. Her etap, bir öncekinin çıktısına bağlı olarak sıralı şekilde ilerlemekte ve seri üretim hazırlığına zemin hazırlamaktadır. Zaman çizelgesi; araştırma, marka geliştirme, ürün tasarımı, prototipleme, test, dijitalleşme ve ticarileşme aşamalarını kapsamaktadır. Kritik yol üzerindeki görevler öncelikli olarak izlenmektedir.



01

Başlangıç & Araştırma

Eki 2026 – Kas 2026: Pazar araştırması, marka ve ürün konsepti.

02

Prototip & Test


Ara 2026 – Mar 2027: 20
prototip üretimi, pilot
uygulama ve performans
testleri.

03

Dijital & Ticarileşme

Nis 2027 – Tem 2027:
Dijital altyapı,
pazarlama ve seri
üretim hazırlığı.


Phases



01.10.2026 – 23.07.2027 proje döneminde ana etapların başlangıç-bitiş ilişkisi. Her etap sıralı ve bağımlı şekilde planlanmış olup kritik yol üzerindeki görevler önceliklendirilmiştir. Aşağıda üç ana faz grubu ve tahmini süreleri gösterilmektedir.

Gantt Şeması

++++



01

Araştırma & Marka

Eki 2026 – Ara 2026 | ~12 hafta

02

Ürün, Prototip & Test

Oca 2027 – Nis 2027 | ~16 hafta

03

Dijitalleşme & Ticarileşme

May 2027 – Tem 2027 | ~11 hafta



Projenin kritik yolu; Tasarım → Tedarik → Prototip → Test → Pilot Uygulama → Seri Üretim Hazırlığı adımlarından oluşmaktadır. Bu faaliyetlerin her biri bir sonrakinin ön koşuludur. Herhangi bir aşamadaki gecikme, proje bitiş tarihini doğrudan etkiler. Bağımlılıkların doğru yönetimi proje başarısının temelini oluşturur.

Kritik Yol ve Bağımlılıklar

++++

01

Tasarım → Tedarik

Teknik tasarım onaylanmadan tedarik başlatılamaz.

02

Prototip → Test


Prototip tamamlanmadan test süreci başlayamaz.

03

Pilot → Seri Üretim

Pilot sonuçları seri üretime geçişin ön koşuludur.

Project Desendency

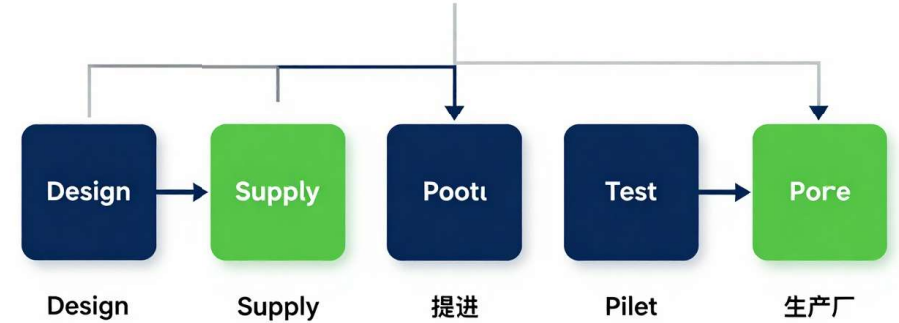



Kaynak ve İş Yüğü Planlaması

Proje süresince her ekip üyesinin iş yükü dengeli biçimde dağıtılmaktadır. Aynı kişinin eş zamanlı iki kritik göreve atanmaması için kaynak çakışma kontrolü yapılmakta; iş günü bazlı kapasite takibi ile proje takvimi korunmaktadır.

++++

Kaynak planlaması; görev atamalarını, kapasite sınırlarını ve bağımlılıkları bir arada değerlendirerek proje gecikmelerini ve ekip tükenmişliğini önlemeyi hedefler.

01

Rol Bazlı Atama

Her görev, yetkinliğe göre belirli bir ekip üyesine atanır; sorumluluk alanları örtüşmez.

02

Kapasite Takibi

İş günü bazlı yük izleme ile aşırı yükleme önlenir.

03

Çakışma Kontrolü

Aynı kişinin aynı anda iki kritik göreve atanmaması öncelikli kural olarak uygulanır.




Satın Alma ve Tedarik Planı

Proje sürecinde kritik bileşenlerin zamanında temin edilmesi, üretim sürekliliği açısından hayati önem taşımaktadır. Tedarik planı; bileşen önceliklendirmesi, alternatif tedarikçi değerlendirilmesi ve teslim süresi optimizasyonunu kapsamaktadır. Tüm kritik bileşenler için en az iki alternatif tedarikçi tanımlanmış; tedarik gecikmeleri proje takviminde tampon sürelerle dengelenmiştir.



++++

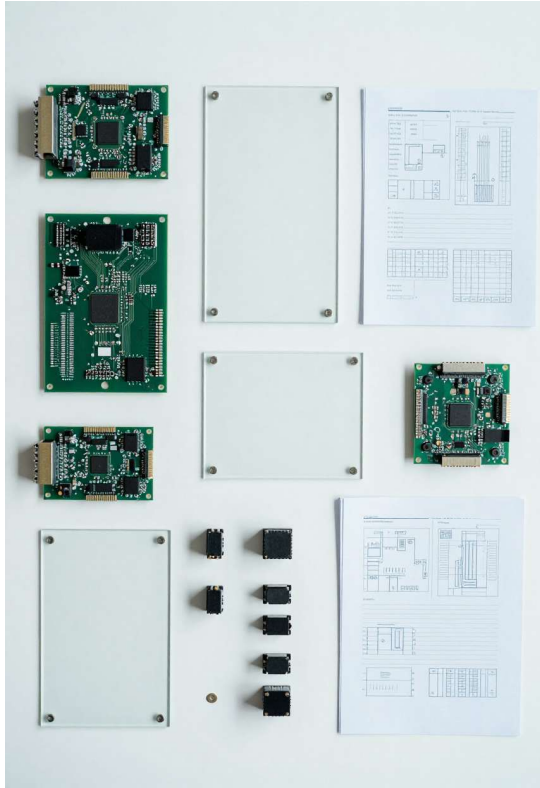

01

Kritik Bileşenler

Şeffaf PV modülleri, çerçeve profilleri ve bağlantı elemanlarının önceliklendirilmesi.

02

Alternatif Tedarikçiler

Her kritik bileşen için en az iki tedarikçi kaynağının değerlendirilmesi ve onaylanması.

03

Teslim Süresi Planı

Tedarik sürelerinin proje takvimiyle hizalanması ve tampon sürelerin tanımlanması.

Maliyet ve Bütçe Yaklaşımı

++++

RENVION projesinde finansal disiplin, tahmini giderlerin her zaman fiili giderlerden yüksek tutulması ilkesine dayanır. Bu yaklaşım, beklenmedik maliyetlere karşı güvenlik tamponu oluşturur ve bütçe aşımının önüne geçer.

01 Prototip ve Test Maliyetleri

20 prototip üretimi, malzeme temini, montaj ve elektriksel performans testleri için ayrılan bütçe kalemleri; %20 yedek pay ile planlanır.

02 Üretim ve Operasyon Giderleri

Pilot uygulama, seri üretim hazırlığı, tedarik zinciri ve operasyonel giderler; fiili harcama takibi ile düzenli revize edilir.

03 Bütçe Güvenlik Tamponu

Tahmini giderler fiili giderlerden %15–25 yüksek tutularak finansal esneklik ve proje sürekliliği güvence altına alınır.



Risk Yönetimi

++++

Operasyonel ve teknolojik riskler; tedarik zinciri aksaklıkları, prototip üretim gecikmeleri ve entegrasyon hatalarını kapsar. Erken test döngüleri ve modüler geliştirme yaklaşımı bu riskleri azaltır.

Finansal ve rekabet riskleri; bütçe aşımaları, rakip ürünlerin hızlı piyasaya girişi ve yatırımcı güveni ile ilgilidir. Tahmini giderlerin fiili giderlerin üzerinde tutulması ve sürekli pazar izleme temel önlemlerdir.

01

Operasyonel & Teknolojik

Tedarik gecikmeleri, entegrasyon hataları ve üretim aksaklıklarına karşı modüler test ve yedek tedarikçi planı.

02


Finansal & Rekabet

Bütçe aşımı ve rakip girişine karşı tampon bütçe, erken ticarileşme ve güçlü marka konumlandırması.

03

İtibar & Önleyici Aksiyonlar

Ürün başarısızlığı ve olumsuz geri bildirimlere karşı şeffaf iletişim, pilot uygulama verileri ve sürekli iyileştirme döngüsü.

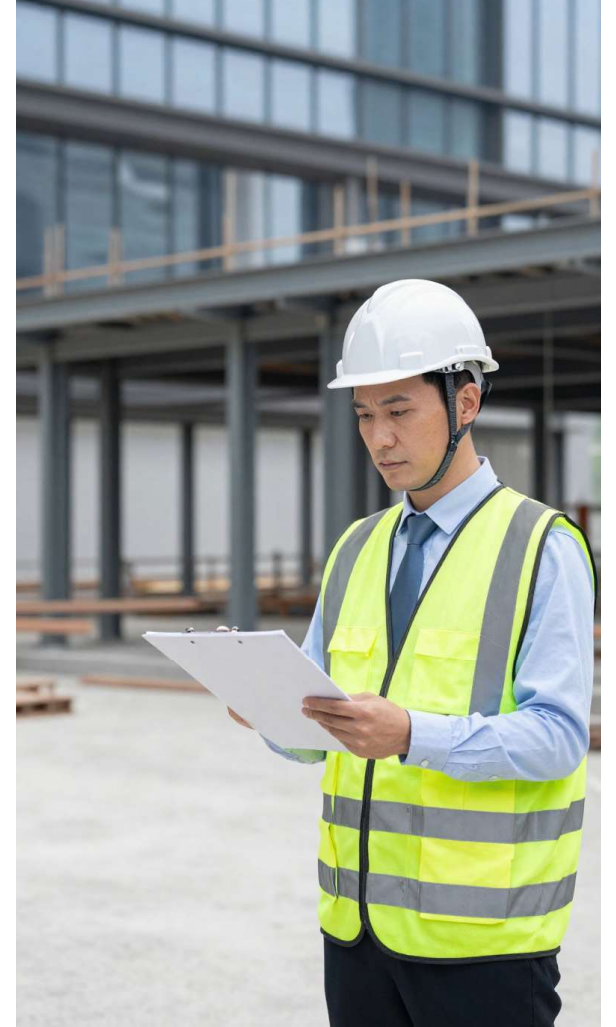



Prototip Geliştirme Süreci

++++

Prototip geliştirme süreci; tasarımın teknik olarak sonlandırılması, üretim altyapısının hazırlanması ve ilk fiziksel prototiplerin tamamlanmasını kapsamaktadır. Her prototip, gerçek kullanım koşullarına yakın ortamlarda değerlendirilerek ürünün seri üretime hazır hale getirilmesi için kritik veri sağlar.



01

Tasarım Sonlandırma

Teknik çizimler, malzeme seçimi ve üretim dosyalarının hazırlanması.

02

Üretim Hazırlığı

Tedarik zinciri kurulumu, üretim ortağı seçimi ve proses doğrulama.

03

İlk Prototip Teslimi

20 prototipten ilk serinin tamamlanması ve ön değerlendirmeye alınması.

20 Prototip Planı

20 prototip, üretim sürecinden teknik testlere ve değerlendirme döngüsüne kadar yapılandırılmış bir plan dahilinde yönetilmektedir. Her prototip, belirlenen performans kriterlerine göre test edilmekte ve sonuçlar iyileştirme sürecine aktarılmaktadır. Proses; üretim → teknik test → değerlendirme → iyileştirme adımlarını kapsamakta olup her aşamada elde edilen veriler bir sonraki iterasyona girdi sağlamaktadır.



++++

01

Prototip Üretimi

20 birimin modüler yapıda üretilmesi ve kalite kontrolü.

02

Teknik Testler

Elektrik performansı, dayanıklılık ve çevre koşulları testleri.

03

Değerlendirme ve İyileştirme

Test verilerinin analizi ve iteratif geliştirme döngüsü.



10 pilot uygulama, RENVION şeffaf güneş modüllerinin gerçek kullanım koşullarında değerlendirilmesi için farklı yapı tiplerine ve coğrafi bölgelere kurulacaktır. Her pilot noktadan toplanan veriler; enerji üretimi, kullanıcı deneyimi ve ürün dayanıklılığı açısından analiz edilerek iyileştirme süreçlerine aktarılacaktır.

Pilot Uygulama

++++

01

Konut Pilotları

4 konut uygulaması; güney cephe pencere entegrasyonu.

02

Ticari Bina Pilotları

4 ofis ve ticari bina; cam cephe performans testi.

03

Geri Bildirim ve İyileştirme

2 endüstriyel pilot; çok boyutlu kullanıcı geri bildirimi.





Test Planı

Test süreci; prototiplerin elektrik performansını, mekanik dayanıklılığını ve gerçek kullanım koşullarındaki güvenilirliğini sistematik biçimde doğrulamak üzere tasarlanmıştır. Her test aşaması, uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirilecektir.

++++

Test planı; 20 prototip üzerinde yürütülecek ölçüm, stres ve saha testlerini kapsar. Sonuçlar 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlarda izlenerek seri üretime geçiş kararı desteklenecektir.

01

Elektrik Performansı

Güç çıkışı, verimlilik oranı ve enerji dönüşüm performansının ölçülmesi ve doğrulanması.

02

Dayanıklılık

UV, nem, sıcaklık döngüsü ve mekanik stres testleriyle uzun ömür doğrulanması.

03

Gerçek Kullanım Koşulları

Pilot uygulamalarda saha performansı, güvenilirlik ve kullanıcı deneyimi değerlendirmesi.



Performans Takibi

++++

Prototip ve pilot uygulamalar sonrasında sistem performansı 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlarda izlenerek sürekli iyileştirme sağlanır.

Her ölçüm döneminde elektrik üretimi, dayanıklılık ve kullanıcı memnuniyeti verileri toplanarak raporlanır ve gerekli optimizasyonlar uygulanır.

01

3 Aylık Kontrol

İlk performans verileri ve sistem kararlılığının değerlendirilmesi.

02


6 Aylık Değerlendirme

Ara dönem analizi ve iyileştirme aksiyonlarının belirlenmesi.

03

9 & 12 Aylık İzleme

Uzun vadeli verimlilik ve seri üretime hazırlık raporlaması.

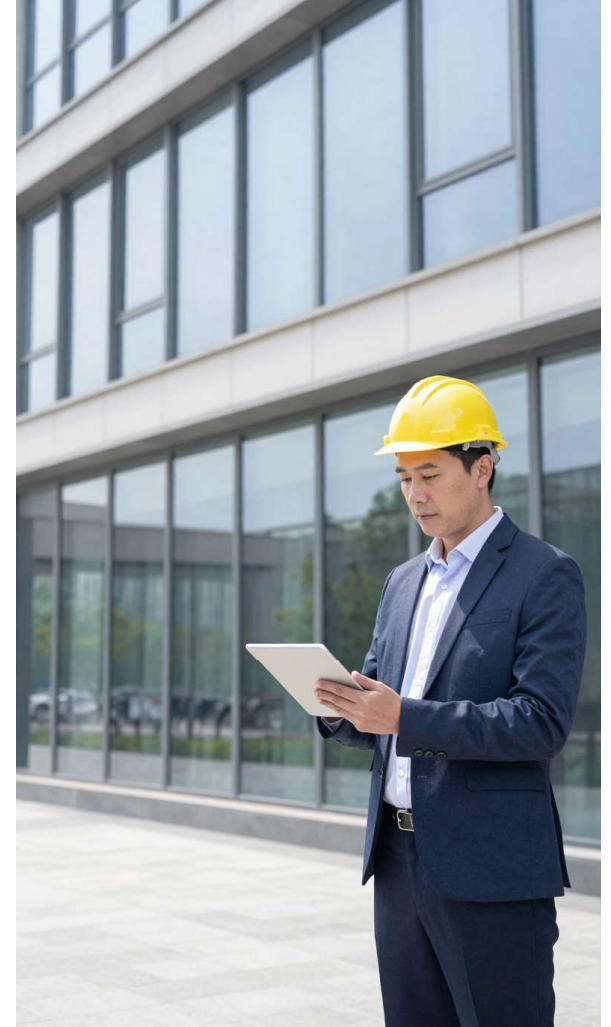

Dijital Altyapı

++++



Web & Wix

RENVION'un dijital varlığı Wix üzerinde kurulu profesyonel web sitesiyle desteklenmektedir. Ürün tanıtımı, iletişim formları ve marka içerikleri bu platform üzerinden yönetilmektedir.

GitHub & Render

Tüm yazılım projeleri GitHub'da sürüm kontrolüyle yönetilmekte; geliştirilen uygulamalar Render platformu üzerinden canlıya alınmaktadır. Sürekli entegrasyon ve dağıtım süreçleri bu altyapıyla sağlanmaktadır.

Python / Flask

Altyapısı

SmartLead AI ve diğer dijital araçlar Python/Flask tabanlı hafif backend mimarisiyle geliştirilmiştir.



SmartLead AI

++++

SmartLead AI, RENVION için geliştirilen yapay zeka destekli lead toplama ve iletişim prototipidir. Potansiyel müşterilerin otomatik olarak tespit edilmesi, sınıflandırılması ve takip süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

01 Lead Toplama

Web ve sosyal medya kanallarından potansiyel müşteri verilerinin otomatik toplanması ve veri tabanına aktarılması.


02 Aday Sınıflandırma

AI modeli ile adayların ilgi düzeyi, sektör ve önceliğe göre otomatik skorlanması ve segmentasyonu.

03 AI Destekli İletişim

Kişiselleştirilmiş mesajlaşma, otomatik takip ve dönüşüm odaklı iletişim akışları.



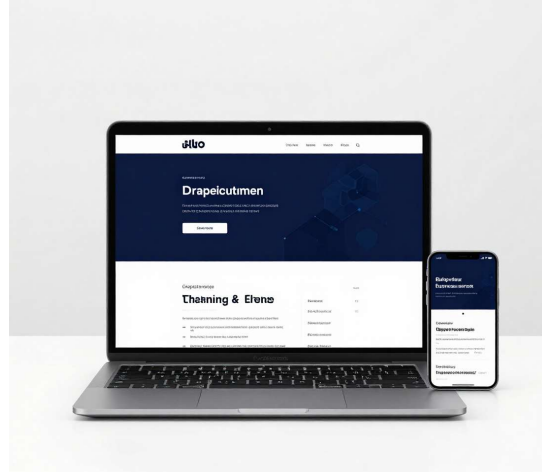

Web ve Dijital Varlıklar

RENVION'un dijital varlıkları; web sitesi, sosyal medya kanalları ve tutarlı marka kimliği üzerine inşa edilmiştir. Her temas noktası, marka değerini ve ürün mesajını güçlü biçimde iletecek şekilde tasarlanmıştır.

+++++

Tüm dijital platformlarda tutarlı görsel kimlik, net mesaj hiyerarşisi ve hedef kitleye yönelik içerik stratejisi uygulanmaktadır. Dijital varlıklar, RENVION'un ticarileşme sürecinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır.

01

Web Sitesi

Wix tabanlı kurumsal web sitesi; ürün tanıtımı, lead toplama ve marka anlatısı için optimize edilmiştir.

02

Sosyal Medya

LinkedIn ve Instagram kanalları, B2B ve B2C hedef kitlelere yönelik içerik akışıyla yönetilmektedir.

03

Dijital Kimlik

Renk, tipografi ve görsel dil tutarlılığı tüm dijital temas noktalarında sağlanmaktadır.



Yapay Zeka Kullanımı

++++

ChatGPT, Claude ve Gemini; içerik üretimi, teknik yazarlık ve strateji geliştirme süreçlerinde fikir üretiminden dokümantasyona kadar projenin bilişsel altyapısını destekledi.

Adobe Firefly, Canva AI ve Ideogram; görsel tasarım, marka materyalleri ve sunum içeriklerinin üretiminde kullanılarak fikirden üretime geçiş sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.

01

İçerik & Strateji

ChatGPT, Claude, Gemini ile metin ve analiz.

02


Görsel Tasarım

Firefly, Canva AI ve Ideogram ile üretim.

03

Hız & Verimlilik

Fikirden üretime süreçleri kısaltma.

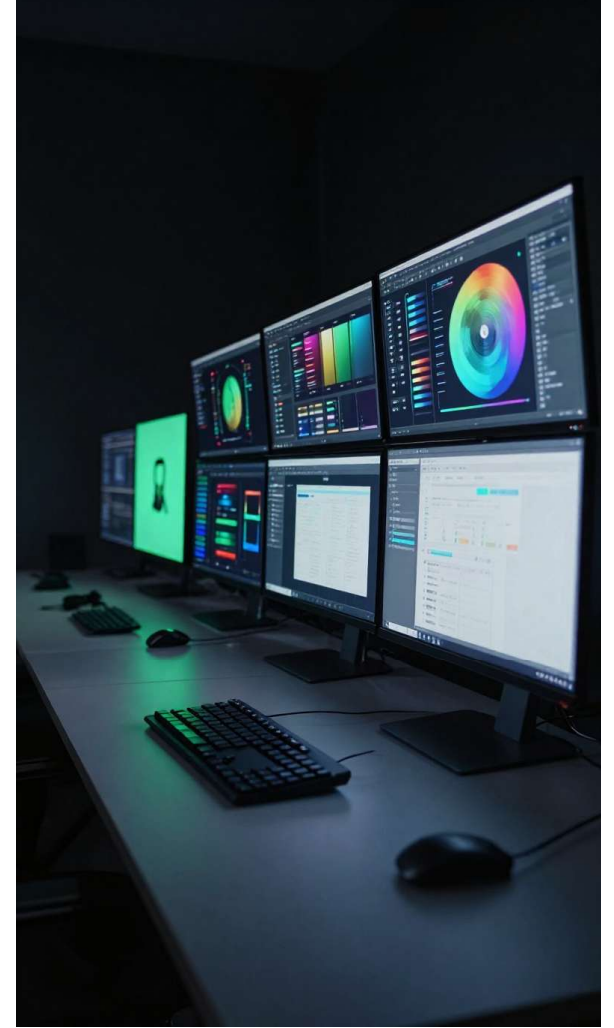



RENVION'un dijital iletişimi; eğitici içerikler, ürün tanıtımları ve kullanıcı hikayeleri üzerine kurulu çok katmanlı bir içerik stratejisiyle şekillenmektedir. Hedef kitleye değer sunan, güven inşa eden ve marka bilinirliğini artıran içerik tipleri sistematik biçimde planlanmaktadır.

Pazarlama ve İçerik Stratejisi

+++++

01

Eğitici & Teknoloji İçerikleri

Şeffaf güneş enerjisi, akıllı cam ve enerji verimliliği konularında bilgilendirici içerikler.

02

Ürün Tanıtımı & Arka Perde

Prototip geliştirme süreci, tasarım kararları ve üretim aşamalarının paylaşımı.

03

Kullanıcı Hikayeleri & Kampanyalar

Pilot uygulama deneyimleri, kullanıcı geri bildirimleri ve dönemsel lansman kampanyaları.



Ticarileşme ve Büyüme Planı

Prototip ve pilot uygulama süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından RENVION, seri üretime ve pazara açılmaya hazır hale gelir. Bu aşama; üretim altyapısının kurulması, satış kanallarının devreye alınması ve kontrollü büyüme stratejisinin hayata geçirilmesini kapsar.
Hedef: 2027 sonu itibarıyla ilk ticari satışların gerçekleştirilmesi ve sektördeki konumun güçlendirilmesi.



++++

01

Seri Üretim Hazırlığı

Üretim altyapısı, tedarik zinciri ve kalite süreçlerinin kurulumu.

02

Satış Kanalları ve İş Birlikleri

Doğrudan satış, distribütörler, mimarlık ve inşaat sektörü iş birlikleri.

03

Kontrollü Büyüme

Pazar geri bildirimine dayalı ölçekleme ve ürün ailesi genişletme.

Proje Sonuçları ve Gelecek Vizyonu

++++

Çıktılar

Marka kimliği oluşturuldu, 20 prototip üretildi, 10 pilot uygulama tamamlandı, dijital altyapı kuruldu ve SmartLead AI prototipi geliştirildi.

Vizyon

RENVION; pencereye entegre şeffaf güneş enerjisi çözümleriyle seri üretime hazır, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir ürün ailesi kurmayı hedeflemektedir.

Sonraki Adımlar

Seri üretim, stratejik ortaklıklar ve uluslararası pazara açılım.



Gelecek Vizyonu

++++

RENVION, pencereye entegre şeffaf güneş enerjisi çözümünden yola çıkarak sürdürülebilir bir ürün ailesi inşa etmeyi hedeflemektedir. Seri üretim hazırlığından yeni uygulama alanlarına uzanan bu vizyon, markanın uzun vadeli büyüme stratejisinin temelini oluşturmaktadır.

01 Seri Üretime Hazırlık

20 prototip ve 10 pilot uygulama sonuçlarına dayalı optimize edilmiş üretim süreçleri ve ölçeklenebilir tedarik zinciri kurulumu.

02 Yeni Ürün ve Uygulama Alanları

Cephe sistemleri, akıllı bina entegrasyonu ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik genişletilmiş ürün portföyü geliştirme hedefi.

03 Sürdürülebilir Ürün Ailesi

Enerji üretimi, yönetimi ve izlemeyi bir arada sunan modüller, birbirine entegre RENVION ürün ekosistemi.





RENVION ekibiyle iş birliği yapmak ve bu vizyonu birlikte büyütmek için bizimle iletişime geçin. Proje dönemi 01.10.2026–23.07.2027 boyunca elde ettiğimiz kazanımları ve seri üretime giden yolu birlikte şekillendirelim.

Fikirden Ürüne, Üründen Pazara

++++

RENVION, pencereye entegre şeffaf güneş enerjisi çözümüyle enerji ve yapı teknolojilerini bir araya getiriyor. 20 prototip, 10 pilot uygulama ve kapsamlı test süreçleriyle seri üretime hazırlanan RENVION, sürdürülebilir bir gelecek için tasarlandı.

İletişim:



www.renvion.com-test



testinfo@renvion.com



+90 (212) 000 00 00
